



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) พร้อมทั้งได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าวต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยจึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและจะได้ดำเนินการเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อทราบและได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๐๘๗ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย <http://www.kudnoi.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสงดี ไสจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1

(รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
- อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	3
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล.....	3
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	6
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	9

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 วิสัยทัศน์.....	10
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....	10
2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา.....	11
2.4 การวางแผน.....	12
2.5 การจัดทำงบประมาณ.....	13
2.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568).....	14
2.7 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา.....	15
2.8 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2567).....	22
2.9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568).....	23
2.10 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย.....	68

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและสำหรับเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การประสานแผนโครงการที่เกี่วข้องไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผนพัฒนาฯ ที่มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขถึงปัจจุบันที่ได้ประกาศใช้แล้วด้วย นั้น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (พ.ศ. 2561) หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยประกาศใช้แล้ว ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเป็นการติดตามการใช้
 ใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการ
 ติดตามและประเมินผลที่สำคัญ ดังนี้

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
 หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดู
 ว่าแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
 กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
 ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ
 การพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
 ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
 ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง
 (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิด
 ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนใน
 เขตตำบล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
 สมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุข
 รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
 แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
 รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
 ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
 เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
 ปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
 ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้นำไปจัดทำงบประมาณหรือดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 4) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารงาน การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดฯ ผู้บริหารระดับสำนัก กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
- 6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของสำนัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบครึ่งปีแรก

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการติดตามนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

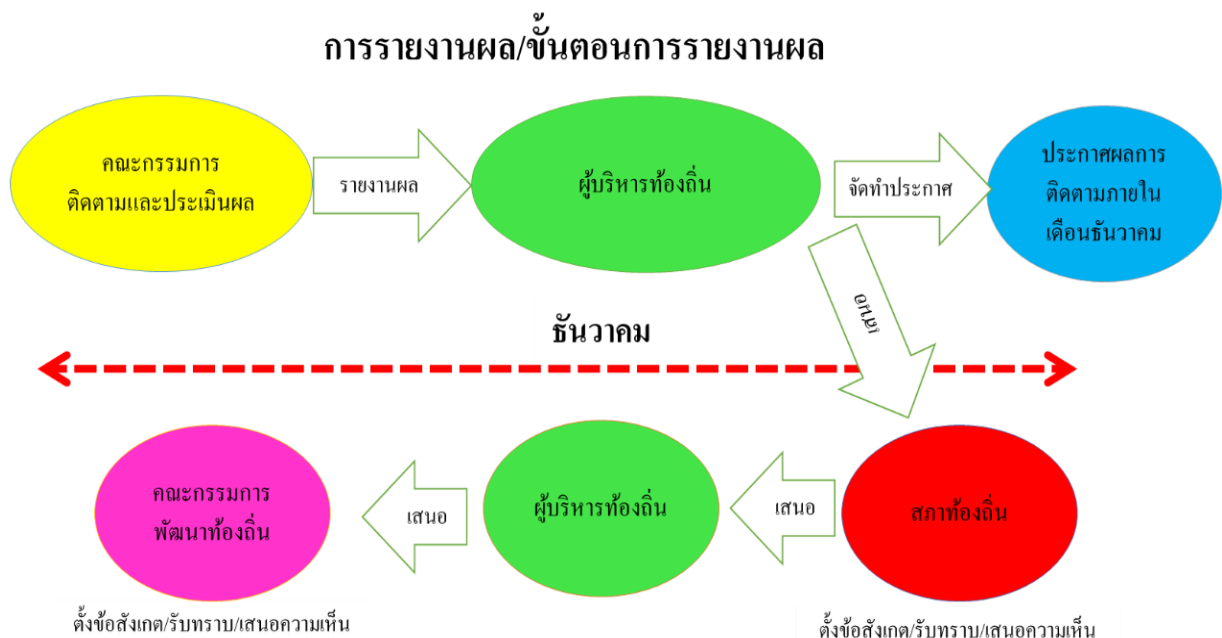

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น

2. แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุดอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดและมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ
8. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จึงรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในอนาคตข้างหน้า คือ

“บริการล้ำหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

2. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 7 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	1.1) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการแก่ประชาชน 1.2) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 1.3) พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถการจัดเก็บรายได้ 1.4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบสารสนเทศ สร้างความโปร่งใสในองค์กร
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2.1) เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนในตำบลต่างๆ ด้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.2) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ 2.3) พัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ 2.4) พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น 2.5) ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในตำบล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3.1) วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2) พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 3.3) ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4.1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 4.2) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	5.1) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 5.2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5.3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
6. ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 6.2) เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสำนึกรับผิดชอบต่อการจัดการเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 6.3) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	7.1) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันยาเสพติด 7.2) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

4. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รวมถึงแผนพัฒนาที่มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไขถึงปัจจุบันที่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	49	4,480,000	56	11,040,000	56	11,040,000	56	11,040,000	56	11,040,000
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	63	24,742,840	63	24,733,840	76	25,022,840	75	25,042,840	75	25,022,840
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	316	558,747,200	340	596,800,200	412	674,869,100	424	684,244,100	434	704,137,100
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	520,000	8	520,000	8	520,000	9	820,000	10	1,320,000
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	10	3,030,000	9	2,430,000	13	4,075,600	12	3,475,600	13	4,075,600
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19	1,750,000	19	1,750,000	20	2,250,000	20	2,250,000	20	2,250,000
7. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	31	4,810,000	31	4,790,000	33	5,590,000	34	5,790,000	34	5,790,000
รวม	496	598,080,040	526	642,064,040	618	723,367,540	630	732,662,540	642	753,635,540

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. การจัดทำงบประมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 54 โครงการ งบประมาณ 26,476,355 บาท และใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 51 โครงการ รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ รวมเป็น 52 โครงการ/ครุภัณฑ์ งบประมาณ 22,211,000 บาท รวมโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 106 โครงการ งบประมาณ 48,687,355 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เฉพาะปี 2568		บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568		จ่ายจากเงินสะสมประจำปี 2568		รวมนำมาจัดทำงบประมาณประจำปี 2568	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	56	11,040,000	6	420,000	-	-	6	420,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	76	25,022,840	20	19,535,255	-	-	20	19,535,255
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	412	674,869,100	13	5,291,100	51	19,509,000	64	24,800,100
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	520,000	5	460,000	-	-	5	460,000
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	13	4,075,600	2	250,000	-	-	2	250,000
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20	2,250,000	4	180,000	-	-	4	180,000
7. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	33	5,590,000	4	340,000	1	2,702,000	5	3,042,000
รวม 7 ยุทธศาสตร์	618	723,367,540	54	26,476,355	52	22,211,000	106	48,687,355

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568 และได้นำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 เท่านั้น

6. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

6.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ปี 2568		นำมาจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2568		นำมาจัดทำ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	56	11,040,000	6	420,000	10.71	-	-	6	-	-	-
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	76	25,022,840	20	19,535,255	26.32	12	1	7	-	9,101,318.94	46.59
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	412	674,869,100	64	24,800,100	15.53	0	39	25	-	-	-
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	520,000	5	460,000	62.50	4	-	1	-	294,400	64.00
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	13	4,075,600	2	250,000	15.38	-	-	2	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20	2,250,000	4	180,000	20.00	1	-	3	-	24,450	13.58
7. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	33	5,590,000	5	3,042,000	15.15	1	-	4	-	26,100	0.86
รวม 7 ยุทธศาสตร์	618	723,367,540	106	48,687,355	17.15	18	40	48	-	9,446,268.94	19.40

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 เท่านั้น

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

1.2 รายงานผลการดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1

(รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)						
ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 18 โครงการ		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ + เงินสะสม ฯลฯ
1	โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2568)	618	723,367,540	2.91	16.98	16.98
2	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568	54	26,476,355			
3	จ่ายจากเงินสะสม	52	22,211,000			
4	จัดทำแผนการดำเนินงาน					
	- ข้อบัญญัติฯ	54	26,476,355			
	- เงินสะสม	52	22,211,000			
	รวม	106	48,687,355			
5	สามารถดำเนินการได้					
	- ข้อบัญญัติฯ	18	9,446,268.90			
	- เงินสะสม	-	-			
	รวม	18	9,446,268.90			


หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 เท่านั้น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

จำแนกรายยุทธศาสตร์

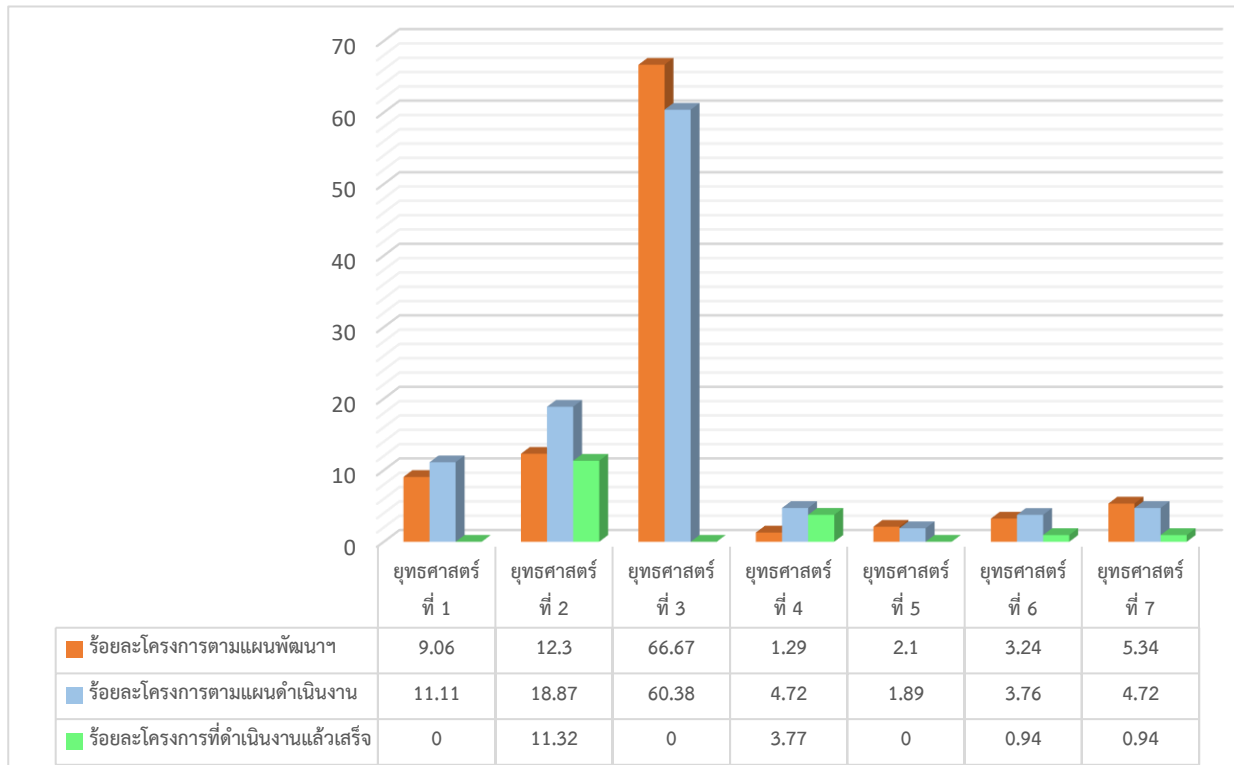

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568 และนำมาจัดทำ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2568 เท่านั้น

6.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำมาจัดทำงบประมาณปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

6.2.1 โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	กั้นเงินประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลการดำเนินงาน (31 มีนาคม 2568)				ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18	4,272,300	17	1	-	-	3,920,800	91.77
รวม	18	4,272,300	17	1	-	-	3,920,800	91.77

6.2.2 โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ผลการดำเนินงาน (31 มีนาคม 2568)				ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	2,220,000	3	-	-	-	2,213,363	99.70
รวม	3	2,220,000	3	-	-	-	2,213,363	99.70

6.2.3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		ผลการดำเนินงาน (31 มีนาคม 2568)				ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	9,999,700	1	1	-	-	7,450,000	74.50
รวม 1 ยุทธศาสตร์	2	9,999,700	1	1	-	-	7,450,000	74.50

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)			
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13	5,291,100	-	0	12	1	0
2	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	51	19,509,000	-	0	27	24	0
3	กัณเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18	4,272,300	3,920,800	17	1	0	0
4	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2	9,999,700	7,450,000	1	1	0	0
5	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3	2,220,000	2,213,363	3	0	0	0
รวม		87	41,292,100	13,584,163	21	41	25	0
คิดเป็นร้อยละ		100	100	32.90	24.14	47.13	28.73	0

รวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	6	420,000	-	-	-	6	-	-ข้อบัญญัติฯ 2568
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20	19,535,255	9,101,318.94	12	1	7	-	-ข้อบัญญัติฯ 2568
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	87	41,292,100	13,584,163	21	41	25	-	-ข้อบัญญัติฯ 2568 -เงินสะสมปี 2568, 2566 -กักเงินปี 2567 -อุดหนุนเฉพาะกิจปี 2567
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	460,000	294,400	4	-	1		-ข้อบัญญัติฯ 2568
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	2	250,000	-	-	-	2	-	-ข้อบัญญัติฯ 2568
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	180,000	24,450	1	-	3	-	-ข้อบัญญัติฯ 2568
7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	3,042,000	26,100	1	-	4		-ข้อบัญญัติฯ 2568 -เงินสะสมปี 2568
รวม	129	65,179,355	23,030,431.94	39	42	48	-	
คิดเป็นร้อยละ	100	100	35.33	30.00	33.00	37.00	-	

หมายเหตุ : รวมโครงการทั้งหมดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จำนวน 129 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี 2568 และนำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 48,687,355 บาท
2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่นำมาจัดทำงบประมาณ.ปีที่ผ่านมา จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 16,492,000 บาท


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ดังนี้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี 2568 และนำมาจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2568 จำนวน 106 โครงการ งบประมาณ 48,687,355 บาท

2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่นำมาจัดทำงบประมาณปีที่ผ่านมา จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 16,492,000 บาท

รวมโครงการตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จำนวน 129 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 65,179,355 บาท ผลการเบิกจ่าย 23,030,431.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.33 โดยมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ดังนี้

โครงการทั้งหมด	129 โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00
อยู่ระหว่างดำเนินการ	42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.00
ยังไม่ได้ดำเนินการ	48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.00
ยกเลิกโครงการ	0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

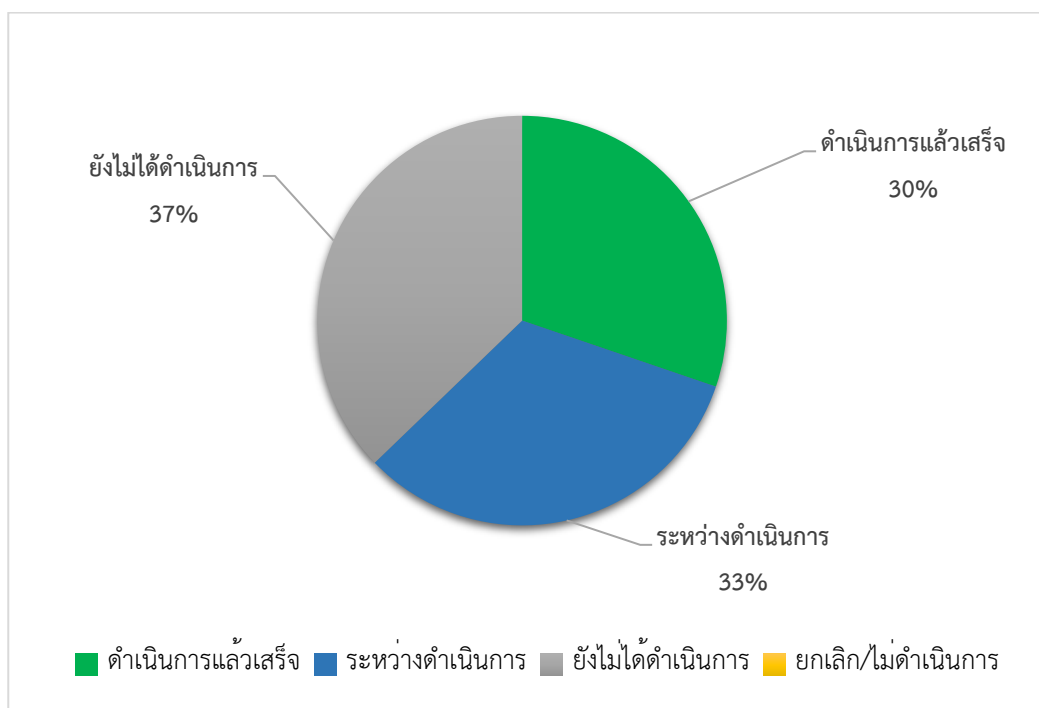


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

จำแนกรายยุทธศาสตร์

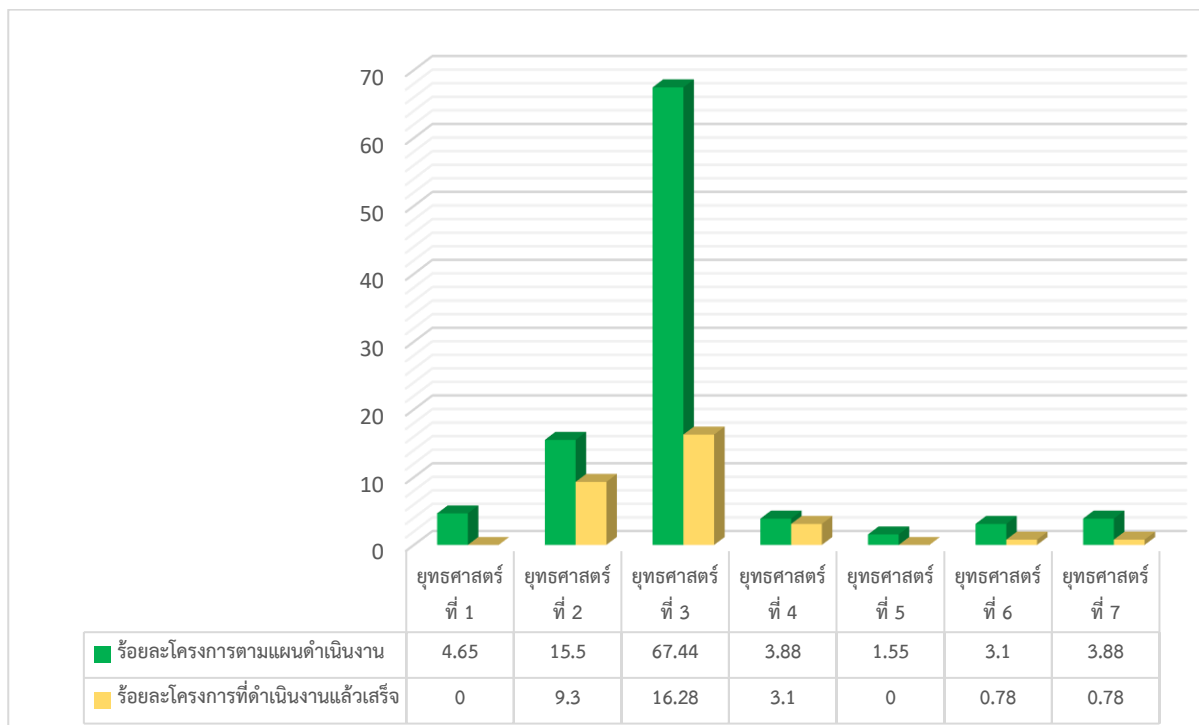


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

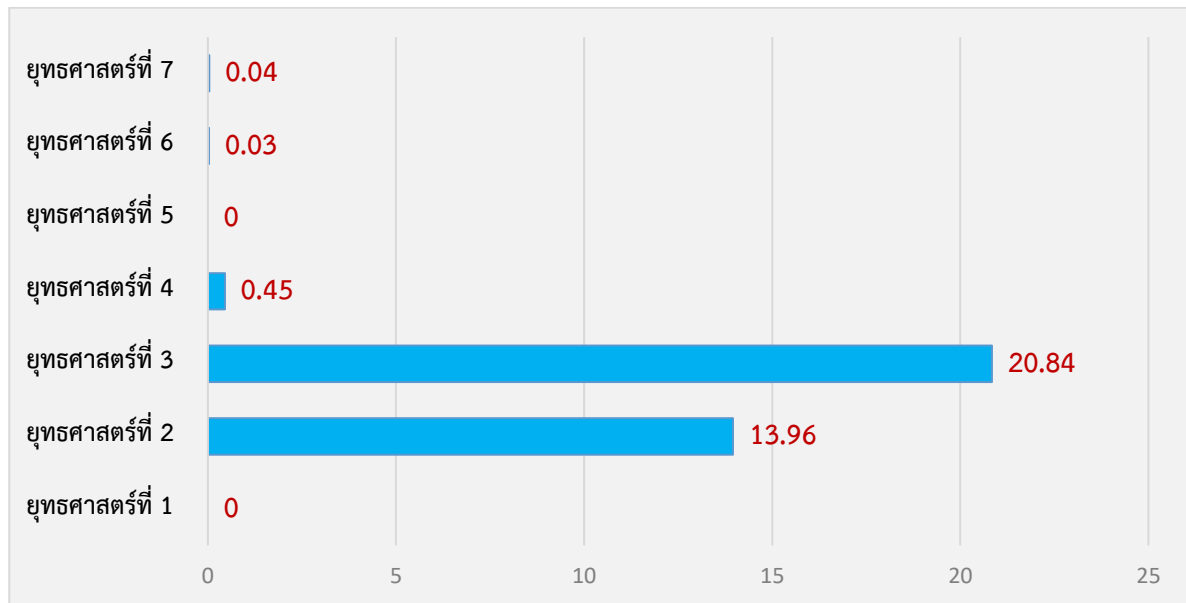

ยุทธศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	13.96
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	20.84
4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.4
5. การพัฒนาด้านการเกษตร	0
6. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.03
7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0.04
รวม	35.33

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้บริหารแก่ประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด	จัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	300,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 1 โครงการ				300,000	-	-	-	-	-	1	-	-

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการ อบต.พบประชาชน	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมออกให้บริการประชาชนหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่	30,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี	สำนักปลัด	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนม พรรษาฯ รัชกาลที่ 10 วันจักรี ฯลฯ	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	จัดอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	10,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
4	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานของ อบต.กุดน้อย	สำนักปลัด	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานของ อบต.กุดน้อย	10,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
5	โครงการประชามระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	สำนักปลัด	จัดประชุมประชามเพื่อจัดทำ/ทบทวนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 5 โครงการ				420,000	-	-	-	-	-	5	-	-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ศพด.)	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)	49,155	17,748	36.11	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน)	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการเบิกเงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	132,300	14,508	10.97	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	อาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กุดน้อย และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตตำบลกุดน้อย จำนวน 5 โรงเรียน	918,700	340,307.94	37.04	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
4	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านกุดน้อย	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านกุดน้อย	324,000	143,100	44.16	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
5	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนเสลา	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านโนน เสลา	180,000	79,200	44.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
6	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสลัก ไต่	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง สลักไต่	432,000	195,750	45.31	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
7	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)	616,000	297,000	48.21	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
8	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนพรพิทยาคม	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนพรพิทยาคม	456,000	256,050	56.15	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 8 โครงการ				3,108,155	1,343,663.94	43.23	-	8	-	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคติดต่อ	กองสาธารณสุข	จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน อบต. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคติดต่อแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกุดน้อย	กองสาธารณสุข	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและมีการสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข	รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
4	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหามโรคขาดสารไอโอดีน	กองสาธารณสุข	ประชาชนมีการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ	30,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวร ขัตราช นาารี	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าโดยการฉีด วัคซีนให้แก่สุนัขและ แมว	50,000	24,970	49.94	มี.ค. - ก.ย. 68		✓			ข้อมูลยัญติฯ ปี 2568
รวม 5 โครงการ				210,000	24,970	11.89	-	-	1	4	-	-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุในเขตตำบลกุด น้อย จำนวน 100 คน ได้รับการอบรมพัฒนา ศักยภาพ	60,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพคนพิการในยุค 4.0	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน ในเขต ตำบลกุดน้อยได้รับการ อบรมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ	25,000	23,285	93.14	28 ก.พ. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม	สตรีตำบลกุดน้อยจำนวน 50 คน ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพ	20,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 3 โครงการ				105,000	23,285	22.18	-	1	-	2	-	-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในเขตตำบล กุดน้อยได้รับเบี้ยยังชีพ	13,244,400	6,380,800	48.18	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	✓				ข้อมูลผู้ ปี 2568
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัว คนพิการในเขตตำบล กุดน้อยได้รับเบี้ยความ พิการ	2,707,200	1,285,600	47.49	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	✓				ข้อมูลผู้ ปี 2568
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการ สังคม	ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต ตำบลกุดน้อยได้รับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	43,000	35.83	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	✓				ข้อมูลผู้ ปี 2568
รวม				16,071,600	7,709,400	47.97	-	3	-	-	-	-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพภายในตำบลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลกุดน้อย	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้อย จำนวน ๕๐ คน ได้รับการอบรมอาชีพ	40,500	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม				40,500	-	-	-	-	-	1	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำนวน 13 โครงการ)												
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสี่แยกต้นแจง - มอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	473,000	-	-	6 ก.พ. 68 – 6 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากหลังวัด - ถึงประปา บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	479,000	-	-	27 ก.พ. 68 – 27 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากบ้านกุดเต่าถึง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านไก่อ่	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	484,000	-	-	6 ก.พ. 68 – 6 พ.ค. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกรอบหมู่บ้าน หนองสลักไธ (ใหม่) หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,050 ตารางเมตร	497,000	-	-	6 ก.พ. 68 – 6 พ.ค. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า หมู่บ้าน ดอนนกเขา หมู่ที่ 5	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 780 ตารางเมตร	473,000	-	-	21 ก.พ. 68 – 21 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน โนนเสลา หมู่ที่ 6 - บ้านวังกรวด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 780 ตารางเมตร	473,000	-	-	11 ก.พ. 68 – 11 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร	360,000	-	-	21 ก.พ. 68 – 21 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - สามแยก ดอนมะนาว , บ้านหัวสระ บ้าน ดอนมะนาว หมู่ที่ 7	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 780 ตารางเมตร	473,000	-	-	11 ก.พ. 68 – 11 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
9	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทาง การเกษตรจากบ้าน ไก่อ่ซ่า หมู่ที่ 10 ถึง บ้านวังกรวด	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,150 ตาราง เมตร	139,000	-	-	6 ก.พ. 68 – 6 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
10	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางหลัง วัดบ้าน ใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักไค	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,080 ตาราง เมตร	494,000	-	-	6 ก.พ. 68 – 6 พ.ค. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
11	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำจากสี่แยก บ้านนายบรรเจ็ด - บ้านนายชาลี บ้าน สะพานหงส์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมฝά คสล.กว้าง	281,000	-	-	25 มี.ค. 68 – 22 มิ.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
			0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ต่อ 1 ฝา หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 62.50 ตาราง เมตร									
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายประกอบ - นางอำพร บ้าน ปรังค์เก่า หมู่ที่ 13	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 625 ตารางเมตร	365,000	-	-	27 ก.พ. 68 – 27 เม.ย. 68		✓			ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
13	โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อ อบต. กุดน้อย	กองช่าง	ก่อสร้างป้ายชื่อ อบต. กุดน้อย ขนาดกว้าง 11 เมตร สูง 2 เมตร ตาม แบบรูปและรายการที่ อบต. กำหนด	365,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม				5,291,100	-	-	-	-	12	1	-	-
2) โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม อนุมัติตามมติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 (จำนวน 32 โครงการ)												
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกตัน แจ่ง - มอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 750 ตารางเมตร	490,000	-	-	ก.พ. – ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
15	โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้างสะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง 2 เมตร ความยาว 15 เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. กุดน้อย กำหนด	350,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากประปาหมู่บ้าน ถึงบ่อขยะ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร	500,000	-	-	25 มี.ค. 68 – 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
17	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่พัฒน์ถึงคลองโกรกสวน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 180 เมตร	270,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
18	โครงการขุดลอกคลองโกรกสวน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ขุดลอกคลองขนาดความกว้างปากบน 4 เมตร ปากล่าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 300 เมตร	140,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
19	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางจาก บ้านกุดเต่าถึงบ้าน หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านไก่อ่เสา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร	500,000	-	-	25 มี.ค. 68 – 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโค้งโรงเรียน - ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสลักไต่ หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร	495,000	-	-	ก.พ. - ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองสลักไต่ หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร	800,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน ดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านไก่อ่เสา บ้าน ดอนนกเขา หมู่ที่ 5	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 411 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เชื่อมต่อทาง 26 ตาราง เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 2,492 ตาราง เมตร	1,619,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอน นกเขา หมู่ที่ 5 ถึง ตำบลบ้านหัน	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	323,700	-	-	ก.พ. - ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอุทัย - สระน้ำประปา บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร	165,600	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
25	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ้าน โนนเสลา หมู่ที่ 6 - นาหนอง บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 1 จุด หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง เมตร	310,000	-	-	25 มี.ค. 68 - 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน โนนเสลา หมู่ที่ 6 - บ้านวังกรด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร	165,600	-	-	22 มี.ค. 68 - 19 มิ.ย. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดจากคอก ปศุสัตว์ - ทางเข้า หมู่บ้าน บ้านดอน มะนาว หมู่ที่ 7	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	500,000	-	-	21 มี.ค. 68 – 19 มิ.ย. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
28	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกขอยบ้านนาย สมจิตร สายต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิม บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	210,000	-	-	25 มี.ค. 68 – 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง สมใจ - บ้านนายหลั่น บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร	57,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ฉกาจ - บ้านนายเลิศ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	120,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
31	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสายใจ สีตาดวง ถึงบ้าน นางไผ่ พรหมพันธุ์ใจ บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 0.50 เมตร	211,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
32	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. จาก บ้านนายบุญหลาย พรหมพันธุ์ใจ ถึงบ้าน นายปริญญา วัลลิภากร บ้านถนน นาดี หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 147 เมตร ลึก 0.50 เมตร	352,800	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
33	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. จาก บ้านนายชูศักดิ์ คุลสูงเนิน ถึงเหมือง สาธารณะประโยชน์ บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 164 เมตร ลึก 0.50 เมตร	393,600	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากกลาง หมู่บ้าน-ท้ายหมู่บ้าน บ้านไถ่เสา หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 320 ตาราง เมตร พื้นที่เชื่อมไม่น้อย กว่า 22 ตารางเมตร	240,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง วัลภา ไส้จันทิก บ้านไถ่เสา หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 296 ตาราง เมตร	177,600	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
36	โครงการขยายถนน คสล.สายจากนานาง สมคิด เตียนจันทิก ถึงหน้าร้านค่านาย บุญเลี่ยน เตียนจันทิก บ้านไถ่เสา หมู่ที่ 10	กองช่าง	ขยายถนน คสล. ขนาด ความกว้างข้างละ 1 เมตร ของสองฝั่งถนน ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	180,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
37	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทาง เกษตรจากบ้านไโก่เส้า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน วังกรวด บ้านไโก่เส้า หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 3,250 ตาราง เมตร	500,000	-	-	25 มี.ค. 68 - 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจาก ร้านค้านายชำนาญ ถึงบ่อประปาคุ้มบ้าน โนน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	1,080,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
39	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล. บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง แบบ 2 ช่อง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความ ยาว 5 เมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
40	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากแยกถนน สะพานหงส์ หมู่ที่ 12 ไปดอนมะนาวถึงชาย ทุ่งหนองมะเดื่อ บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 930 ตารางเมตร	139,500	-	-	25 มี.ค. 68 - 22 ก.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาง กิ้ง ถึงบ้านนางอนงค์ บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 86 ตารางเมตร	51,600	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
42	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น คสล. คลองกลาง ทุ่ง บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	กองช่าง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร	450,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
43	โครงการจัดทำแผ่น คอนกรีตปิดรางส่งน้ำ เข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	กองช่าง	ขนาดแผ่น คสล. กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 เมตร	180,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากทางเข้า หมู่บ้าน ถึงบ้านนาง พรบ บริเวณสามแยก บ่อหินบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 1,500 ตาราง เมตร พื้นที่เชื่อมต่อไม่น้อย กว่า 22 ตารางเมตร	900,000	-	-	ก.พ. - ก.ย. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
45	โครงการขยายถนน คสล. ฝั่งขวาจากศาลา ประชาคมบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ถึงศาลา ประชาคมบ้านสะพาน หงส์ หมู่ที่ 12 เส้นหน้า โรงเรียน บ้านบ่อทอง หมู่ 14	กองช่าง	ขยายถนน คสล. ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 400 ตาราง เมตร	240,000	-	-	ก.พ. - ส.ค. 68		✓			เงินสะสม ปี 2568
รวม				12,612,000	-	-	-	-	27	5	-	-
3) โครงการจากเงินสะสม อนุมัติตามมติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 17 โครงการ)												
46	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทาง บ้านนายสมบุญ แก้ว จันทิก ถึงทางแยกบ้าน นางทองคำ สายซมดี บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
47	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางจาก ประปาหมู่บ้าน ถึงบ่อ ขยะ บ้านวังกรด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท้าย หมู่บ้านไปบ่อใหญ่ บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 640 ตาราง เมตร	358,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
49	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้าน หนองสลักได หมู่ที่ 4 - หลังวัดบ้านใหม่ กม.9	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปากทางบ้าน หนองสลักได ถึงท้าย หมู่บ้าน บ้านหนอง สลักได หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่เชื่อมถนน 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 227 ตารางเมตร	127,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
51	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากบ้านดอน นกเขา หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่ กม.9	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก <u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 1,680 ตาราง เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ดำเนินการ ถมดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.50 เมตร ดำเนินการลงหินคลุก บนผิวดินถมความกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
52	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายจากบ่อ ขยะเชื่อมสายหน้า บ่อนไก่ - บ้านโนน เสลา หมู่ที่ 6	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
			ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร									
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - สามแยกดอนมะนาว, หัวสระ บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
54	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายทางบ่อทิ้งขยะ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	80,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
55	โครงการกั้นรั้วบ่อทิ้งขยะด้านทิศตะวันตก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างรั้วขนาดความยาว 60 เมตร สูง 180 เมตร	180,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางกชกร ลีจันทิก ถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์บ้านถนนนาดี หมู่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร ลึก 0.50 เมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
57	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านไก่อ่เส้า หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
58	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลังวัดบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักไถ่	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
59	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกใหญ่ - หน้าวัดบ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 114 เมตร ลึก 0.50 เมตร	265,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้าน นางคำกอง - บ้าน นางพนม บ้านปรังค์ เก่า หมู่ที่ 13	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 327 ตาราง เมตร	225,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
61	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบริเวณหลัง ป่าช้าเก่า บ้านบ่อ ทอง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร	200,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
62	โครงการก่อสร้าง กำแพงบริเวณหลังป่า ช้าเก่า บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างกำแพงความสูง 1.80 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 180 เมตร	500,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
รวม				6,435,000	-	-	-	-	-	17	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
4) โครงการจ่ายจากเงินสะสม อนุมัติตามมติการประชุมสภา อบต.กุดน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (จำนวน 3 โครงการ)												
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสลักไธ หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง	546,000	546,000	100	12 ก.ค. 67 - 10 ต.ค. 67	✓				เงินสะสมปี 2566
64	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางดารุณี - เหมืองสาธารณะ (บ้านนางล้นทม) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอบนอกกว้าง 0.50 เมตร ขอบในกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 178 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ต่อ 1 ฝา หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร	429,000	429,000	100	8 ก.ค. 67 - 6 ต.ค. 67	✓				เงินสะสมปี 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากร้านค้านายชำนาญ - บ่อประปาคุ้มบ้านโนน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,970 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร	1,247,000	1,238,363	99.31	18 มี.ย. 67 - 16 ต.ค. 67	✓				เงินสะสม ปี 2566
รวม				2,222,000	2,213,363	99.70	-	3	-	-	-	-
5) โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (จำนวน 18 โครงการ)												
66	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกต้นแจง - มอเตอร์เวย์บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 726 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	348,000	348,000	100	12 ก.ค. 67 - 10 ต.ค. 67	✓				กั้นเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางปิ่น บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทางพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร	74,700	74,700	100	16 ก.ย. 67 – 15 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก ศาลาวัด - บ่อประปา หมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 450 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง	250,600	250,600	100	16 ก.ย. 67 – 15 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
69	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกภายในหมู่บ้าน กุดเต่าบับ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านกุดเต่าบับ หมู่ที่ 3 จุดที่ 2 ซอยตา เหมา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	163,000	163,000	100	15 ส.ค. 67 – 14 ต.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	350,500	350,500	100	19 ก.ย. 67 – 18 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
71	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 - นาหนอง	กองช่าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	238,000	238,000	100	15 ส.ค. 67 – 14 ต.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
72	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกหัวสระ	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	350,000	350,000	100	19 ก.ย. 67 – 18 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
73	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนายเล็ก - บ้านนายหวาย กม. 10 บ้านใหม่ กม. 9 หมู่ที่ 11	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	324,500	324,500	100	24 ก.ย. 67 – 23 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
74	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจาก บ้านนางฮวย - บ้านนายสมหมาย บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 336 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมพื้นที่ เชื่อมคอนกรีตขนาดกว้าง 7 ตารางเมตร	186,000	186,000	100	16 ก.ย. 67 – 15 ธ.ค. 67	✓				กันเงิน ปี 2567
75	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปากทางบ้าน หนองสลักไธ ถึงท้าย หมู่บ้าน บ้านหนอง สลักไธ หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	351,000	340,000	96.87	26 ธ.ค. 67 – 25 มี.ค. 68	✓				กันเงิน ปี 2567
76	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง บังอร - บ้านนายยม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 180 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	100,000	97,500	97.50	21 พ.ย. 67 – 19 ก.พ. 68	✓				กันเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
77	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง พรรณี - บ้านนางมาลี บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 180 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	100,000	97,900	97.90	14 พ.ย. 67 – 12 ก.พ. 68	✓				ก้นเงิน ปี 2567
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุกัญ - บ้านนางพันระณี บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 75 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	41,000	40,300	98.29	21 พ.ย. 67 – 19 ก.พ. 68	✓				ก้นเงิน ปี 2567
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอบ เหมืองสาธารณะ ประโยชน์ด้านทิศ ตะวันตก บ้านถนน นาดี หมู่ที่ 9	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 525 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทางและ พื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า 31.50 ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	322,000	-	-	18 ธ.ค. 67 – 17 มี.ค. 68		✓			ก้นเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
80	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้าน นางวิเชียร -บ้านนาง จำเนียร บ้านไถ่เส้า หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า 84 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	46,000	45,000	97.83	4 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	✓				ก้นเงิน ปี 2567
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกทางเข้า หมู่บ้าน บ้านไถ่เส้า หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. <u>ช่วงที่</u> <u>1</u> ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อย กว่า 174 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง <u>ช่วงที่</u> <u>2</u> ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 108 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง <u>ช่วงที่</u> <u>3</u> พื้นที่เชื่อมสายทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 116 ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อม คูข้าง 1:1 2x2	224,000	223,700	99.87	3 ธ.ค. 67 - 3 มี.ค. 68	✓				ก้นเงิน ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
82	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสี่แยกบ้าน หัวสระปรางค์เก่า หมู่ที่ 8, 13 ถึงบ้านนาย สำรวย จันทรฝ่าย	กองช่าง	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง	382,000	370,600	97.02	14 พ.ย. 67 – 12 ก.พ. 68	✓				กันเงิน ปี 2567
83	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บริเวณข้างบ่อหิน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์บริเวณ ข้างบ่อหิน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ขนาดพื้นที่ 1,188 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร	421,000	420,500	99.88	21 ธ.ค. 67 – 20 มี.ค. 68	✓				กันเงิน ปี 2567
รวม				4,272,300	3,920,800	91.77	-	17	1	-	-	-
6) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 2 โครงการ)												
84	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านไก่อ่สำ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนกเขา	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,780 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,680 ตารางเมตร ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร	7,450,000	7,450,000	100	31 พ.ค. 67 – 28 ก.ย. 67	✓				เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
85	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 - บ้านวังกรวด	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร	2,549,700	-	-	5 พ.ย. 67 – 4 มี.ค. 68		✓			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 2567
รวม				9,999,700	7,450,000	74.50	-	1	1	-	-	-
รวมทั้งหมด 85 โครงการ				40,830,100	13,584,163	33.27	-	21	41	23	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1) โครงการจ่ายจากเงินสะสม อนุมัติตามมติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 (จำนวน 1 โครงการ)												
1	โครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	1) ขุดขยายขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 2 เมตร 2) ตักกองดินขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมขุดบริเวณกองดินที่ขนย้าย ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 80 เมตร ความลึก 2 เมตร	300,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
2) โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม อนุมัติตามมติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 1 โครงการ)												
2	โครงการขุดลอกขยายบ่อพักน้ำดิบบ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ขุดลอกขยายบ่อพักน้ำดิบขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร	162,000	-	-	-			✓		เงินสะสม ปี 2568
รวม 2 โครงการ				462,000	-	-	-	-	-	2	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนา พื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	100,000	100,000	100	11 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการส่งเสริมราก วัฒนธรรม “ของดีบ้าน ฉั่น”	กอง การศึกษาฯ	จัดซุ้มแสดงสินค้า 1 ซุ้ม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.สีคิ้ว เพื่อส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000	3,930	39.30	23 มี.ค. 68	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 3 โครงการ				160,000	103,930	64.96	-	2	-	1	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในชุมชนตำบลกุดน้อย	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนภายในเขตตำบลกุดน้อย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย ปลูกฝังความสามัคคี ภายในชุมชน	150,000	94,710	63.14	5 - 18 ต.ค. 67	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาด้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนภายในเขตตำบลกุดน้อย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย ปลูกฝังความสามัคคี ภายในชุมชน	150,000	95,760	63.84	5 - 18 ต.ค. 67	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 2 โครงการ				300,000	190,470	63.49	-	2	-	-	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	จัดอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพเกษตรกร การนำมาประยุกต์ใช้และทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่จากแหล่งเรียนรู้หรือจากเกษตรกรต้นแบบ	200,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 2 โครงการ				250,000	-	-	-	-	-	2	-	-

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ ป่าไม้ และให้ความรู้สร้างจิตสำนึกประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	จัดกิจกรรมบำรุงรักษาป่าไม้ ณ แปลงปลูกป่า/ป่าชุมชน	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 2 โครงการ				100,000	-	-	-	-	-	2	-	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
1	โครงการธนาคารขยะ รีไซเคิล	กอง สาธารณสุข ฯ	มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ประจำหมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะตาม หลักวิชาการ	50,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	กอง สาธารณสุข ฯ	- รณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	30,000	24,450	81.50	25 ก.พ 2568	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 2 โครงการ				80,000	24,450	30.56	-	1	-	1		-

7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่งงบประมาณ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในตำบลกุดน้อย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในตำบลกุดน้อย	30,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
2	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสถานศึกษา	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.กุดน้อย 5 โรงเรียน	30,000	26,100	87.00	7 - 12 มี.ค. 2568	✓				ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	130,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
4	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. อบต. กุดน้อย	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. อบต.กุดน้อย	150,000	-	-	-			✓		ข้อบัญญัติฯ ปี 2568
รวม 4 โครงการ				340,000	26,100	7.68	-	1	-	3	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (31 มี.ค. 68)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (31 มี.ค. 68)				แหล่ง งบประมาณ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
จ่ายจากเงินสะสม อนุมัติตามมติการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568												
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1. น้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 2. น้ำหนักของรถรวม น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 3. เป็นราคาพร้อมปั๊ม และอุปกรณ์	2,702,000	-	-	-	-	-	✓	-	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
รวม 1 รายการ				2,702,000	-	-	-	-	-	1	-	-

**ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย**

1. ผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมา คือยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนลำดับที่ 3 คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลำดับที่ 5 คือยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร เห็นควรเร่งดำเนินการ
 2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานกรณีการก่อสร้างถนนแบบรูปายการควรมีการกำหนดไหล่ทางด้วย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร เพราะถนนหลายสายที่ก่อสร้างเสร็จไม่มีไหล่ทาง ฝาท่อถึงกองช่างที่เป็นผู้สำรวจพื้นที่ก่อนนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ควรมีการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อทำไหล่ทางด้วย โดยเฉพาะสายทางหลัก
 3. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดำเนินการเสร็จแล้ว บริเวณจุดสิ้นสุดทางควรปรับระดับของถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะรถเล็กที่สัญจรลำบาก เนื่องจากบริเวณจุดสิ้นสุดทางก่อสร้างมีความต่างระดับมากซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน
 4. ควรมีการดำเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร เพราะช่วงครึ่งปีแรกยังไม่มีการดำเนินโครงการ
-

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

